



Santa Casa de Misericórdia de Guará

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guará (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JANEIRO A MARÇO/2024

“REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”

1. IDENTIFICAÇÃO

EXECUTOR: Santa Casa de Misericórdia de Guará **CNES:** 2078414

CNPJ nº 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406

Alvará de Funcionamento: SPM2430076350 (Prazo de validade: 16/02/2025)

Endereço: Rua 24 N° 872, Jardim Paulista.

CEP: 14.790-000

Município: Guará/SP

1.1 RESPONSÁVEL

Franciene Lucas

CPF: 225.806.668-93

Função: Interventora (Decreto Municipal nº 6306 de 09 de maio de 2022).

2. OBJETO: Reforma e adequação da maternidade.

3. VIGÊNCIA INICIAL: 11/04/2022 a 10/10/2022

VIGÊNCIA 1º ADITIVO: 11/10/2022 a 10/04/2023

VIGÊNCIA 2º ADITIVO: 11/04/2023 a 10/10/2023

VIGÊNCIA 3º ADITIVO: 11/10/2023 a 10/04/2024

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL: Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

5. ATIVIDADES E METAS

5.1 ATIVIDADES

Atividades	Executado
Licitação	Executada
Contratação da empresa vencedora	Executada
Início da Obra	Executada
Execução da Obra	Executada
Término da Obra	Executada
Inauguração da ala reformada	Não Executado
Monitoramento e avaliação	Em Execução
Prestação de contas.	Em Execução

5.2 METAS

Metas	Executado
Reforma da maternidade	Executada

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico - financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado

6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá, através dessas considerações, vem informar que a empresa BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA EPP, entregou a obra finalizada no mês de março de 2024, sem nenhuma intercorrência, cumprindo com o objeto contratado. Sendo assim, o hospital está se empenhando em mobiliar a maternidade, com móveis e equipamentos adquiridos através de recursos de outras emendas parlamentares e também de recursos próprios da instituição. A data da reinauguração foi definida para o dia 29/04/2024.


8. FOTOS DA OBRA EXECUTADA









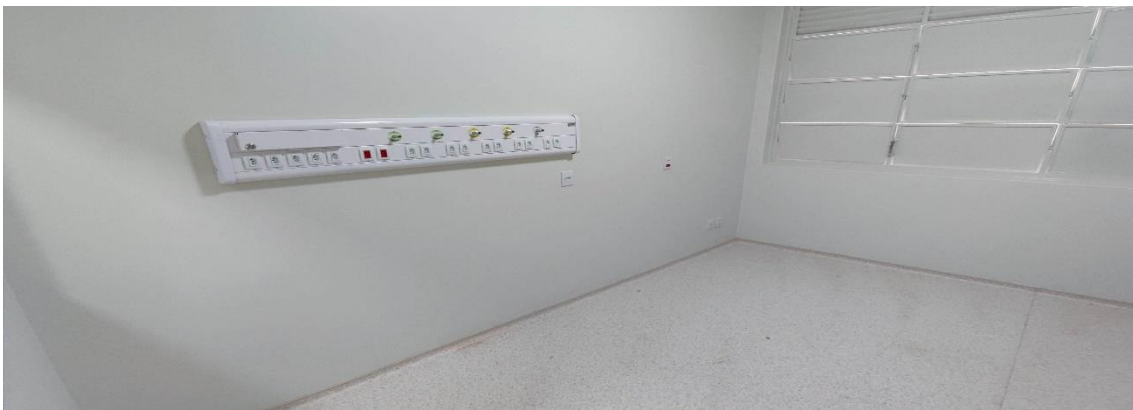



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento







Guará/SP, 12 de abril de 2024.

FRACIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
